

ACTIVIDAD 2: SEGUNDA FASE DE DESARROLLO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS SPRINTS Y EL BACKLOG

Proyecto: TechnoShop

Integrantes del Equipo: Krishna Gabriela Cortes Santos y Jan Ieshua Alonso Gutiérrez

1. PRODUCTO BACKLOG REVISADO Y AJUSTADO (SPER SPRINT 2)

Este backlog ha sido modificado retrospectivamente para reflejar los retos técnicos encontrados durante la codificación en React y la gestión de versiones en GitHub

ID Backlog	Elemento / Historia de Usuario	Prioridad	Estimación Original	Estimación Ajustada	Estado Actual
HU-01	Estructura base responsiva y diseño neón del e-commerce (HTML/CSS)	Alta	5	5	Completado
HU-02	Buscador dinámico de productos en tiempo real (Filtro de arrays)	Alta	5	8- Ajustado	Completado
HU-03	Panel lateral interactivo para detalles técnicos del hardware	Media	5	7- Ajustado	Completado
HU-04	Módulo Educativo: Sección base para "Guías de Hardware"	Media	5	3- Reclasificado	Completado

ID Backlog	Elemento / Historia de Usuario	Prioridad	Estimación Original	Estimación Ajustada	Estado Actual
HU-05	Implementación del Carrito de Compras funcional	Alta	8	8	En Proceso
HU-06	Pasarela de simulación de pago y cierre de orden	Baja	5	5	Pendiente

2. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y AJUSTES TÉCNICOS (REVISIÓN DE SPRINT)

Con base en la filosofía ágil de PMI y Scrum, el backlog y el plan de trabajo sufrieron modificaciones debido a los siguientes bloqueos en tiempo real:

1. **Ajuste de Arquitectura en React (HU-02 y HU-03):** Inconveniente: Se planeaba modularizar la vista de detalles y el buscador en componentes .js externos independientes. Sin embargo, al realizar el paso de estados props entre archivos, se detectaron desfases en la sincronización del catálogo
 - Solución: Se decidió centralizar temporalmente la lógica e interactividad dentro del archivo principal App.js utilizando renderizado condicional. Esto incrementó la estimación de esfuerzo de la tarea, pero garantizó un rendimiento óptimo y sin bugs
2. **Problemas de Control de Versiones (Git y GitHub):** Inconveniente: Durante el despliegue del Sprint 2, la terminal local se congeló debido a conflictos en los puertos del servidor de desarrollo y la falta de user.name y user. email. Adicionalmente, el comando git push inicial falló al intentar duplicar un repositorio que ya existía en la nube
 - Solución: Se pausó el sprint para configurar las variables globales del sistema, se cancelaron los procesos bloqueados en la consola y se aplicó una conexión forzada mediante git remote add origin junto con git push --force para unificar el historial sin pérdida de código
3. **Re priorización del Módulo Educativo (HU-04):** Inconveniente: La carga masiva de archivos y formatos multimedia para las guías técnicas iba a retrasar la entrega del núcleo interactivo de la tienda

- Solución: Se redujo el alcance de la HU-04 en este sprint a sólo maquetar la interfaz base contenedor, moviendo la redacción e integración completa de los textos educativos al Sprint 3

3. FICHAS TÉCNICAS DETALLADAS DEL BACKLOG AJUSTADO

Ficha Técnica: Filtrado Dinámico de Productos en Tiempo Real

- ID: HU-02
- Descripción: Como usuario de TechnoShop, quiero escribir en un buscador para filtrar los componentes Laptops, Monitores, Accesorios instantáneamente sin recargar la página
- Prioridad: Alta
- Estimación de Esfuerzo: 8 Puntos de Historia (Se incrementó por la complejidad de la lógica de filtros).
- Recursos Asignados: Krishna Cortes (Desarrollo Frontend)
- Criterios de Aceptación: El input debe transformar el texto a minúsculas, comparar contra el array de objetos de hardware y renderizar las tarjetas correctas en la grilla. Si no hay coincidencia, debe desplegar un aviso formal de error en la interfaz

Ficha Técnica: Panel de Detalles de Hardware Seleccionado

- ID: HU-03
- Descripción: Como cliente, deseo dar clic en el botón de un producto para que se despliegue un panel lateral interactivo con su precio, categoría y descripción técnica completa
- Prioridad: Media
- Estimación de Esfuerzo: 7 Puntos de Historia (Ajustado por el cambio a renderizado condicional interno)
- Recursos Asignados: Krishna Cortes y Jan Ieshua Alonso
- Criterios de Aceptación: Al presionar "Ver Detalles", el estado global debe almacenar el objeto seleccionado. El botón "Cerrar" debe limpiar el estado (devolverlo a null) para ocultar la barra lateral inmediatamente

4. CALENDARIZACIÓN COMPLETA DE LOS SPRINTS

Sprint 1: Cimientos y Maquetación Estática (Semanas 1-2)

- Tareas: Configuración del entorno React, diseño de la paleta de colores neón en App.css y subida del esqueleto HTML básico
- Recursos: Krishna Cortes y Jan Ieshua Alonso
- Estado: Completado con éxito

Sprint 2: Lógica Interactiva y Manejo de Estados (Semanas 3-4)

- Tareas: Inclusión de hooks useState, implementación del buscador dinámico con. filter (), programación de la barra de detalles condicional y resolución de conflictos de credenciales en GitHub
- Recursos: Krishna Cortes
- Estado: Código actualmente arriba en el repositorio de internet


Sprint 3: Módulo Comercial y Contenidos Educativos (Semanas 5-6)

- Tareas: Desarrollo del estado dinámico del carrito de compras acumulador de precios totales e integración final de las guías de hardware redactadas por el equipo
- Recursos: Jan Ieshua Alonso (Contenidos técnicos) y Krishna Cortes (Lógica del carrito)
- Estado: En Proceso

5. DEMOSTRACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD Y RELACIÓN CON OBJETIVOS

El código actual en producción dentro de App.js demuestra cómo las historias de usuario se tradujeron en funciones lógicas reales:

Relación con los objetivos del proyecto: El objetivo de TechnoShop es validar un modelo ágil de comercio electrónico enfocado en la usabilidad tecnológica. Solucionar los bloqueos de Git y adaptar la lógica de estados nos permitió consolidar una plataforma fluida, donde el usuario puede buscar hardware de manera eficiente, cumpliendo rigurosamente con los objetivos planteados en la metodología PMI del proyecto.

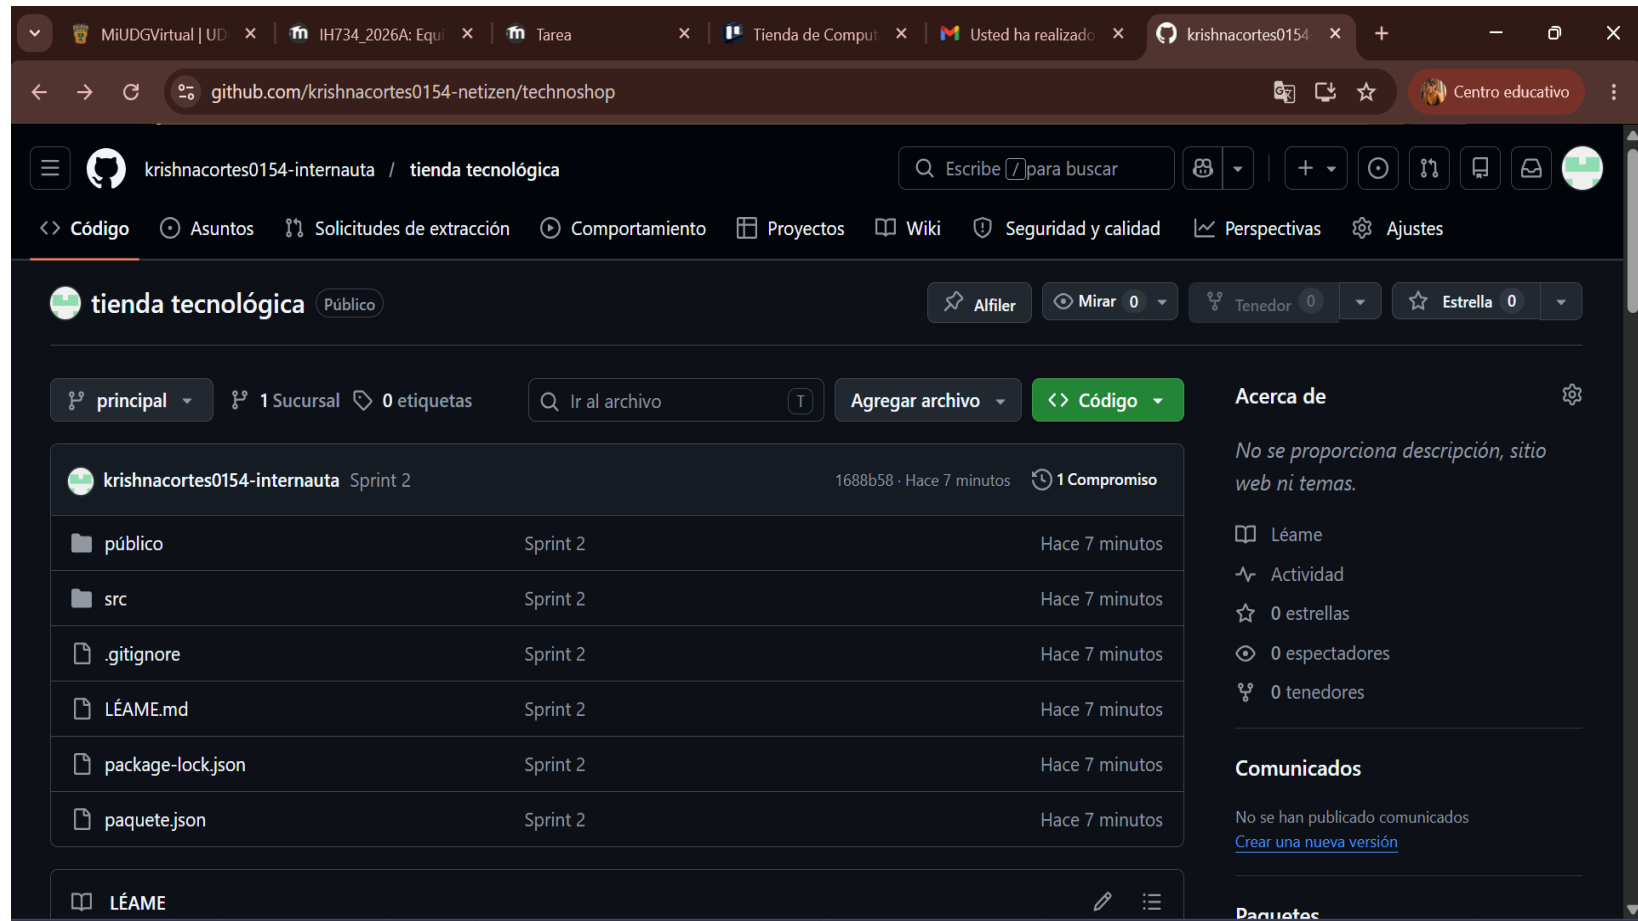

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN FORMATO APA

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7a ed.). Project Management Institute.
- Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agile software development with Scrum. Prentice Hall.
